## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO - PLANILHA DE RISCOS

Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos riscos a seguir:

Avaliação dos riscos - Matriz de Riscos

		Probabilidade									
		Muito baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5					
	Muito alto	5	10	15	20	25					
m	Alto 4	4	8	12	16	20					
a a	Médio 3	3	6	9	12	15					
t	Baixo 2	2	4	6	8	10					
0	Muito baixo 1	1	2	3	4	5					


Legenda Matriz de Riscos


Nível de Risco	Pontuação	Apetite a risco
Extremo	entre 15 e 25	Inaceitável
Alto	entre 8 e 14	Rejeitável
Médio	entre 3 e 7	Aceitável
Baixo	1 e 2	Oportunidade

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	ІМРАСТО	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Planejamento inadequado do quantitativo no ETP	Muito baixa (1)	Alto (4)	Médio (4)	Prévio estudo do estoque existente e quantidade adquirida nas 3 últimas aquisições	Revisão do quantitativo , realização de Termo aditivo nos limites da Lei de Licitações e contratos				Demandante/ Requisitante
2	Termo de referência Inconsistente	Muito baixa (1)	Alto(4)	Médio (4)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contrato de órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares. (ETP)	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do TR em tempo hábil.				Demandante/ Requisitante e subsidiariamente, pelas unidades da área de licitação.
3	Fornecimento de produtos em desacordo com Termo de Referência, impactando nos resultados almejados	Muito baixa (1)	Alto (4)	Médio (4)	Pesquisa e análise prévia das propostas e dos produtos ofertados. Inserção de cláusula de possibilidade de substituição do produto. Conferência dos produtos no momento da entrega para aceite.	Notificação da contratada para substituir os produtos fora dos critérios constantes no TR e acompanhamento da regularização. Caso não ocorra a regularização a tempo, realizar a aplicação das sanções cabíveis.				Demandante/ Requisitante e subsidiariamente, pelas unidades da área de licitação.

## ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – MODELO DE PLANILHA DE RISCOS

Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos riscos a seguir:

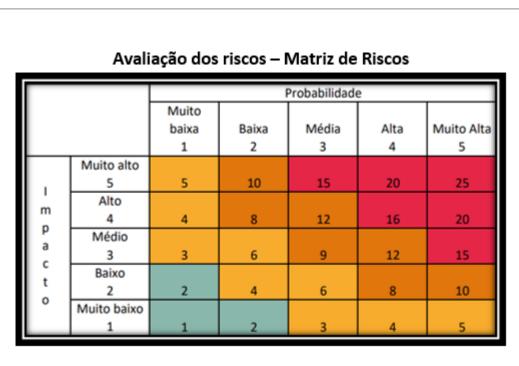

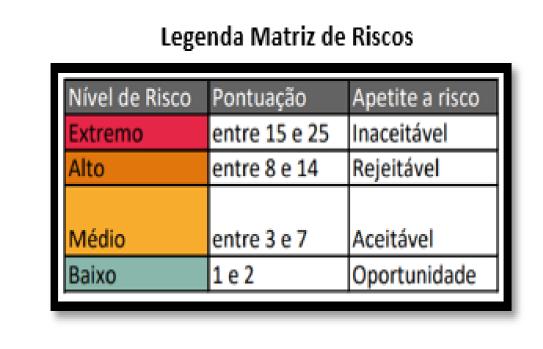

## Nas hipóteses de nível de risco "Alto" ou "Extremo", se a identificação surgir da unidade requisitante, as unidades da área de licitação deverão ser comunicadas. Idêntico tratamento na situação contrária.

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação		2	4	Elaboração de check list (conformidade - legalidade) Contato com a unidade demandante para esclarecimento sobre o objeto demandando. Ampliação dos	Reuniões com as unidades demandantes	1	2	2	Demandante/Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações nas fases de análise preliminar dos artefatos, na pesquisa de
					estudos das soluções de mercado e respectivos custos, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto da contratação  Elaboração de check list. Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada					preços, na análise de juridicidade ou na fase externa  Demandante/ Requisitante (Subsidiariamente, pelas
2	Termo de Referência inconsistente	2	3	6	especificiadaes de cada contratação/ Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).	refazimento do Termo de Referência (conformidade e de modo tempestivo para se evitar frustração do objeto)	1	2	2	unidades da área de licitações nas fases de análise preliminar dos artefatos, na pesquisa de preços, na análise de juridicidade ou na fase externa
3	Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor	1	2	2	Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP).  Análise de como o mercado trata o objeto para entender as	de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando	1	1	1	Demandante/Requisitante (Subsidiariamente, pelas
	(análise/questionamentos na fase interna quanto às exigências contidas no TR/edital, legais e legítimas, mas não usuais)				especificidades de cada contratação/ Reavaliação do ETP e posterior aferição do binômio elemento discriminador x finalidade, para análise no plano da razoabilidade e proporcionalidade das exigências Realização de conferência por	Readequação do TR/edital, eliminando as exigências desnecessárias				unidades da área de licitações)
4	Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência	2	1	2	mais de um servidor e/ou de check list / Refazimento do formulário de acordo com TR. A depender da complexidade, ratificação pela unidade requisitante  Realização de conferência por	Correções, adequações e/ou Refazimento do Formulário de Preços de acordo com o Termo de Referência.  Reavaliação e	1	1	1	Unidades da área de licitações – SePEC
5	Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços)	1	1	1	mais de um servidor (check list) / Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante (a depender da complexidade do objeto).  Levanramento das contrarações que demandam dispêndio de	porém que atendam ao núcleo de	1	2	2	Unidades da área de licitações — SePEC
6	Atraso na cotação de preços (cesta de preços)	1	1	1	tempo maior na fase de pesquisa de preços (histórico). Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interação (feedback) com a unidade requisitante, para avalição da ressonância com o mercado e identificação de eventual causa superveniente de restrição.  Criação de lista de fornecedores e manutenção delas atualizadas,	Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros órgãos para informações sobre cotação de preços em contratações similares.	1	2	2	Unidades da área de licitações — SePEC
7	Quadro comparativo Inconsistente	2	2	4	Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação.  Revalidação de cotações/ampliação da	Retificação do Quadro Comparativo.	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
8	Planilha de Análise Crítica Inconsistente	2	1	2	pesquisa/amostragem.  Realização de conferência por mais de um servidor (check list).  Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação.  Revalidação de cotações/ampliação da	Retificação da planilha de Análise Crítica	1	2	2	Unidades da área de licitações — SePEC
9	Coleta de preços insuficiente, falta de método para tratar os preços obtidos, estimativa de preços inadequada.	2	2	4	Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. / Treinamento da equipe	Correções, adequações e/ou Refazimento da coleta de preços	1	2	2	Unidades da área de licitações – SePEC
10	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	2	2	4	Avaliação dos prazos de tramitação dos atos processuais em cotejo com a data estimada para entrega do objeto.  Atribuição de ordem de prioridades.	Reuniões setoriais entre os envolvidos e/ou realização de força tarefa	1	2	2	Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP
11	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	2	3	6	meinoria continua no controle e acompanhamento dos processos.  Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento com recursos	informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. Avaliação da necessidade de contratação em regime	1	2	2	Unidades da área de licitações e Demandante/
12	Fracasso na licitação ou licitação deserta	2	2	4	próprios da Administração Questionamento às empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame (verificação de indícios de inexequibilidae de preços e/ou presença de indevidas condições restritivas de participação) Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços.	contratação em regime	1	2	2	Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC
13	Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida	1	3	3	Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações.	os envolvidos, (Administração e adjudicatária). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou Adequação dos	1	2	2	Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/ Requisitante
14	Escolha da modalide licitatória/contratual diversa da determinada na Lei	1	3	3	elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade - legalidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de conferência e de preenchimento de check list	(legalidade). Avaliação da necessidade de	1	1	1	SeEEC
15	Escolha de um modelo de contrato que não seja o adequado para o objeto a ser contratado	1	3	3	elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade - legalidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de análise e de conferência e preenchimento de check list	(legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial, se houver prejuízo risco de solução de continuidade e/ou	1	2	2	SeEEC
16	Elaboração de regramentos incompatíveis com o objeto	1	3	3	elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade - legalidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de análise e de conferência e preenchimento de check list	(legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial, se houver prejuízo risco de solução de continuidade e/ou	1	2	2	SeEEC
17	Adjudicação de licitante com proposta em desacordo com as especificações do edital ou sem documentação completa de habilitação exigida pelo instrumento convocatório	1	3	3	Envio da proposta e da documentação habilitatória para análise da unidade administrativa e/ou técnica e emissão de parecer. Criação de check list e revisão do procedimento antes da proposição da homologação	(proposta e habilitação). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação	1	2	2	CCT
18	Verificação da falta ou insuficiência da reserva orçamentária (pré-empeho) previamente à publicação do Edital/Formalização da contratação	1	4	4	Criação de check list e revisão do procedimento antes da publicação do Edital/Formalização da	outras situações de	1	2	2	SeEEC/COCL

	_			
